MENGUAL

Configurador de puertas filomuro **Alwin**

Cliente:	Teléfono:

Rellene este formulario con sus configuración y háganoslo llegar a **comercial@mengual.com** para que podamos cotizarlo.

1. Dimensiones (mm.)

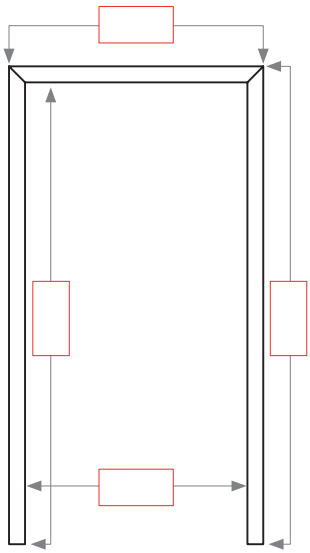

Marco	Hoja	Luz

1. Marcar la medida exterior o/e interior.
2. La medida interior se referirá a la medida de el paso hoja o Luz de paso.
3. La medida exterior se referirá a medida luz que ocupará el marco.
4. Si se marca medida exterior e interior:
   - 4.1. Se fabricará el marco con las medidas exteriores.
   - 4.2. Se mecanizará bisagras y picaporte para las medidas de hoja marcadas en el interior.
   - 4.3. Siempre se tendrá en cuenta que la hoja arrancará desde abajo del marco sea cual sea su medida exterior.

2. Sentido de apertura

☐ Enraso frontal APERTURA DERECHA



☐ Enraso frontal APERTURA IZQUIERDA



☐ Enraso trasero APERTURA DERECHA



☐ Enraso trasero APERTURA IZQUIERDA



3. Tipo de muro

☐ Muro fábrica de ladrillo

☐ Muro de pladur

☐ Grueso de muro en (mm.)

4. Cantidad de puertas

☐

5. Mecanizados bisagras (mm.)

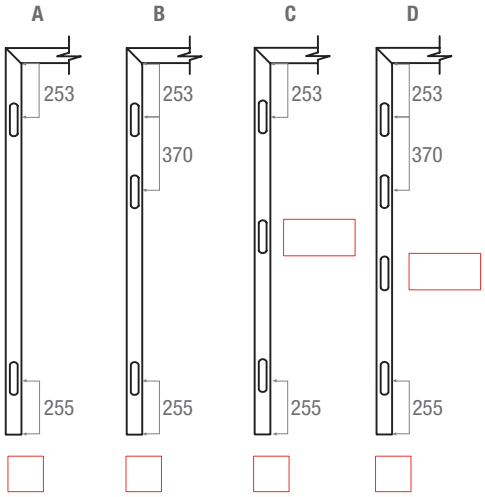

6. Mecanizado cerradero (mm.)

Altura manivela

☐

☐

Señalar la altura del centro de resbalón o manivela e indicar la distancia en mm.

7. Cerradura mágnetica

☐ Normal ☐ Bombillo

☐ Condena

8. Opciones avanzadas

☐ Sin travesaño superior ☐ Sin mecanizado cerradero

☐ Con travesaño inferior ☐ Incluir puerta pre-lacada blanca

Firma y sello:

IMPORTANTE

1. Los pedidos recibidos quedarán pendientes de conformidad hasta que Administración lo acepte como tal.
2. Los plazos de entrega de los pedidos variarán en función del volumen del mismo.
Para pedidos aceptados, el plazo medio se sitúa en 10 días para los marcos y 20 días para las hojas.
3. Todos los Formularios de trabajo irán firmados y sellados por la persona responsable de la empresa.
4. Para otras medidas y formas, consultar con Dpto. Comercial.

En_____ a _____de _____ de 20___

comercial@mengual.com
938 600 536 · www.mengual.com
